PISA – CEMES – 2024

CLIENTE
CEMES S.p.a.

NOME DEL PROGETTO
SOLLEVAMENTO TRAVI PONTE FIUME SERCHIO km 105+826. REGOLAZIONE PLANO-ALTIMETRICA APPARECCHI APPOGGIO E CONSOLIDAMENTO PIANO APPARECCHI APPOGGIO E PULVINI

ANNO
2024

LUOGO
Migliarino Pisano (PI), Italia

DESCRIZIONE:
Operazioni per sollevamenti travate del ponte sul Serchio a Migliarino Pisano al km 105+826 della linea Tirrenica.
Sollevamento di nr. 4 travate metalliche di massimo 100 ton per consentire la manutenzione degli apparecchi d'appoggio a Ponte sul Serchio km 105+826, Migliarino Pisano (PI).
Lavoro realizzato in 3 weekend.

DATI DI SOLLEVAMENTO
- n° 4 campate da 100 ton max
- n° 4 martinetti da 109 ton/cad

DISEGNI

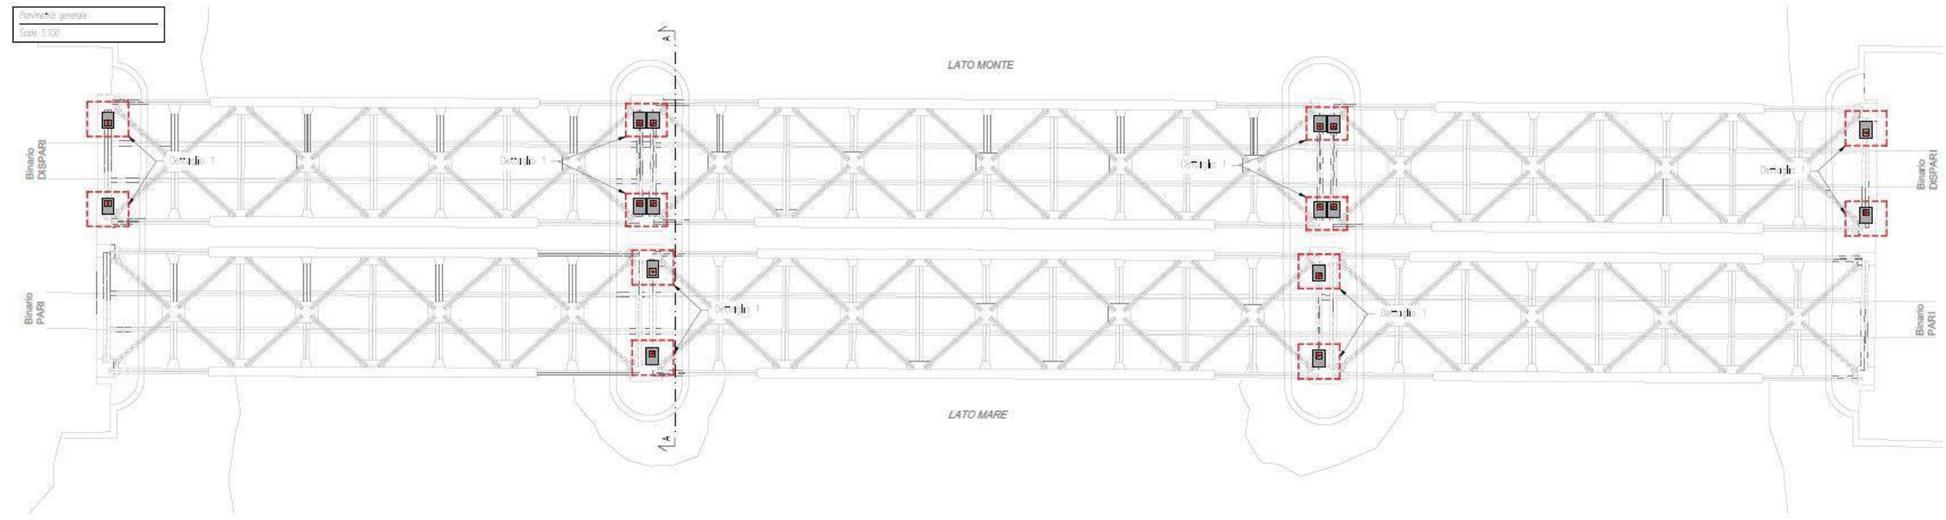

Figura 1 – Planimetria posizionamento martinetti di sollevamento

FOTO

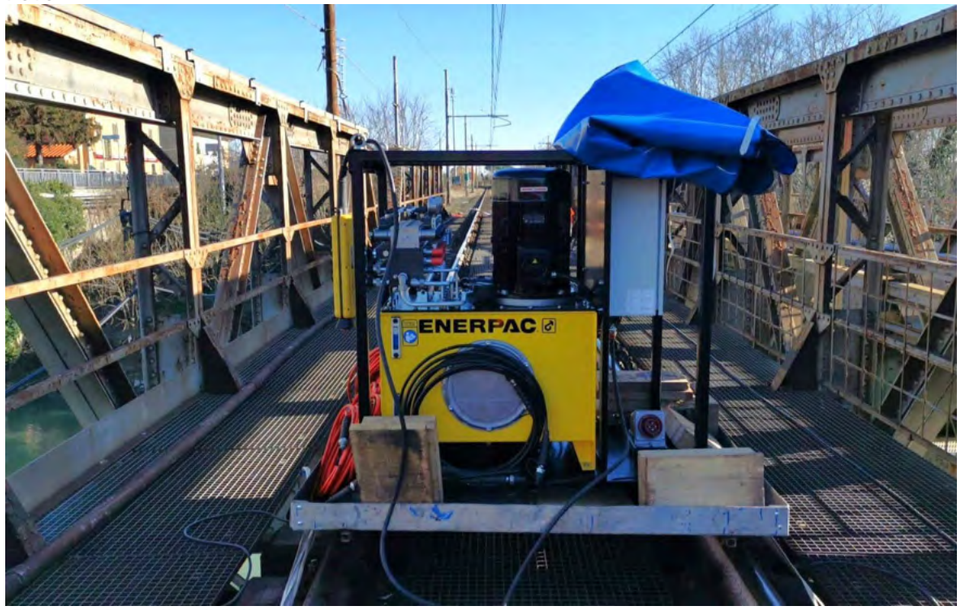

Figura 2 – Centralina di Sollevamento

Figura 3 – Martinetti di sollevamento
